

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율(누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	<b>38%</b>

**사업목표**

- 통학차량 대기공간 등 편의시설을 제공하여 통학 안전 확보

**사업개요**

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업대상: 맘스레이션 50개소
- 주요내용
  - 사업승인 시 맘스레이션 설치 설계반영 및 기존 공동주택 내 설치 지원
  - 도시재생사업지 및 공동주택 인접 도시공원 내 맘스레이션 설치

**예산투자 현황 및 계획**

(단위 : 백만원 / 2024.09.30. 기준)

	소요예산 (a~e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	859	9	350	149	250	250	계속
국비	180	0	60	16	60	60	계속
도비	36	0	12	0	12	12	계속
시비	643	9	278	133	178	178	계속
민간자본	0	0	0	0	0	0	0

※ 공동주택과 시비159백만원(신규 공동주택은 비예산임)  
도시재생과 국비180백만원, 도비36백만원, 시비84백만원 / 공원관리과 시비 400백만원

**연차별 이행확인지표**

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표	
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.		
맘스레이션 설치	계	개소	50	2	14	14	10	10	
	신규 공동주택 내	개소	16	2	7	5	1	1	계속
	기존 공동주택 내	개소	20	-	5	5	5	5	계속
	도시재생사업지 내	개소	6	-	계획수립	2	2	2	계속
	공동주택 인접공원 내	개소	8	-	2	2	2	2	계속
사업추진율(누적값)	%		4	32	60	80	100		

□ **추진실적** (2024년 목표 추진율 : 28.6%)

○ **공동주택 내 맘스태이션 설계반영 등 반영 (추진 중)**

구분	세부사항
신규 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> <li>신규 공동주택 단지 내 <b>18개소</b> 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 2개소 : 서둔지구, 권선C8구역</li> <li>- 2023년 13개소(※ 2023년 목표(7개소) 이상 13개소 초과달성)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1분기) 권선1구역 재건축</li> <li>(2분기) 힐스테이트 수원테라스, 영흥공원푸르지오파크비엔, 서광교파크스위첸</li> <li>(3분기) 이목지구 A3블럭, 이목지구 A4블럭, 센트럴아이파크자이, 권선2구역재건축, 영통1구역 재개발, 화서역 푸르지오 브리시엘, 영통동 961-11</li> <li>(4분기) 당수지구 C3블럭, 당수지구 D3블럭</li> </ul> </li> <li>- 2024년 <b>3개소</b> 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1분기) 재개발111-1구역(북수원렉스비아_3개소)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
기존 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023년 기존 공동주택 단지 내 <b>3개소</b> (※ 2023년 목표(5개소) 미달하여 3개소 달성)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오목천서희스타힐스, 호매실경남아너스빌, e-편한세상광교아파트</li> </ul> </li> </ul>
공동주택 인접공원 내	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024년 <b>1개소</b> 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(3분기) 이의초등학교 주변 어울터 1개소 설치</li> </ul> </li> </ul>

○ **도시재생사업지내 맘스태이션 설치 (추진 중)**

□ **문제점 및 대책**

○ **공동주택 지원사업 신청 저조(공동주택과)**

- 단지에서는 승강기 공사, CCTV공사, 옥상방수공사 등 방법 및 안전관련 공사를 우선시하여, 지원사업을 신청하는 경향이 있음
- 홍보 및 안내를 통한 지원사업 참여 독려


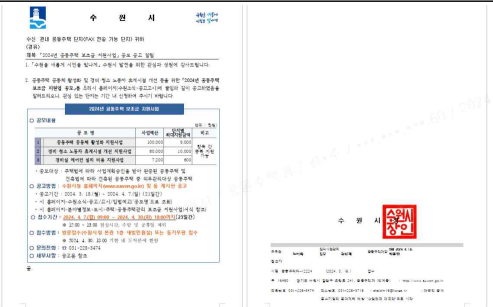
○ **도시공원 예산 및 대상지 확보 지난(공원관리과)**

- 공원 리모델링 등 공원 정비 국·도비, 자체예산 등 확보 노력 및 신규 공원 조성 시 반영 검토

○ **도시재생사업지 내 설치부지 확보 검토(도시재생과)**

- 당초 거점시설 건립공사 부지 내 설치 예정이었으나, 시공사 부도로 인한 공정지연과 이에 따른 맘스태이션 설치 지연
- 도시재생사업지 내 맘스태이션 설치를 위한 주민 수요조사 지속 실시

□ **사업 홍보실적**

	
▶ 시 홈페이지 게시(2024. 3. 18.)	▶ 단지별 공문 발송(2024. 3. 15.)

## □ 향후추진 계획

- 공동주택 내 설치 추진【공동주택과】 ----- 2024. 12월
  - 신규 공동주택 사업계획승인 시 반영(2개소)
  - 기존 공동주택 설치 추진(7개소)
- 도시재생사업지 등 설치 추진(2개소)【도시재생과】 ----- 2024. 12월
- 공원 내 설치 추진(3개소)【공원관리과】 ----- 2024. 12월

담당부서	공동주택과	과장 박종만(2400)	주택행정팀장	조성계(2403)	주무관 신수정(2406)
			임대사업관리팀장	안경하(3050)	주무관 허정혜(3404)
협조부서	도시재생과	과장 김종호(3850)	도시재생사업팀장	오종수(3923)	주무관 유일환(3940)
	공원관리과	과장 이종봉(4190)	공원문화팀장	강미선(4560)	주무관 원예라(4562)
