

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
신규	예산	임기후	2032	수원시	40%

□ 사업목표

- 영통 소각시설 이전 시민 숙원(시민공론화 결과) 해결을 통한 편익 도모
- 지역 주민과의 갈등을 최소화한 친환경 소각시설 건립을 통한 안정적인 생활폐기물 처리 및 도시환경 기초시설 기반 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2032. 6.(9년 소요→행정절차 5.5+시공 3.5)
- 주요내용
 - 폐기물처리시설 종류 : 생활폐기물 소각시설
 - 시설규모 : 500톤/일(소각로 2기×250톤/일) / 부지면적 53,300㎡
 - ※ 시설설치 시점 생활폐기물 배출량 등 여건에 따라 조정 가능
 - 시설건립(안) : 지상(테마파크), 지하(소각시설 등)
 - (지상) 굴뚝(전망대), 관리동, 주민편익시설, 다목적 체육시설, 테마공원 등
 - (지하) 소각시설, 열병합발전설비 등
 - 입지선정 방법 : 희망 지역 공개모집, 전문기관(업체) 사전조사 용역
- 소요예산 : 3,626억원(시설비 2,667, 토지비 426, 주민편익시설 533)
 - ※ 입지선정 관련 사전조사 용역비(2억원), 입지공모 추가 인센티브(500억원) 별도

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2024.12.31. 기준)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	200	200					
국비	0	0					
도비	0	0					
시비	200	200					
민간자본	0	0					

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.까지	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
자원회수시설이전팀 구성			구성					
입지 타당성 사전조사 용역				착수		완료		
입지선정위원회 운영						구성	운영	
입지 선정							입지선정	
사업추진율(누적값)	%		20	40	40	70	100	

※ 분과위원회 협의 및 방침결재를 받아 지표변경

□ 추진실적

○ 자원회수시설이전팀 구성(완료)

- 시설 이전 조직 보강(2023. 3. 31.)
 - 자원회수시설이전TF팀 → 이전팀 직제 승인

○ 입지 타당성 사전조사 용역(추진중)

- 입지선정계획 공고 및 입지 후보지 공개모집 (3차례, 2023. 8. / 2023. 10. / 2024. 1.)
- 입지 타당성 사전조사 용역 진행
 - 입찰 공고(5차례, 2023. 9. ~ 2024. 2.)
 - 사전조사 용역 착수(2024. 3. 20.)
 - 사전조사 용역 착수보고회 개최(2024. 4. 25.)
- 자원회수시설 이전 민관협의체 운영
 - 자원회수시설 이전사업의 추진과정을 주민들과 공유하기 위하여 운영하고 있는 협의체로, 사전조사 용역을 포함한 사업의 진행상황을 공개하고자 함.
 - 민관협의체 발족회의(2024. 1. 30.)
 - 민관협의체 2차 회의(2024. 5. 2.)
 - 민관협의체 3차 회의(2024. 8. 30.)

□ 「2024 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 : 지역주민과의 소통 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 지역주민을 위한 인센티브 확대 검토 - 친환경시설로의 인식전환을 위한 적극적인 시민홍보 - 이전시설의 분산배치 가능여부 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 일부반영 • 검토의견 : 친환경시설 조성 및 인센티브 등 지역주민 적극 홍보 필요 • 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 자원회수시설 민관협의체를 구성하여 지역주민과 소각장 개선이전의 추진 과정을 공유함. - 이전 후보지 사전조사 용역을 진행중이며, 과업내용에 이전시설의 분산배치를 추가하여 검토할 예정임.


□ 향후추진 계획

- 영통지역 주민대표 등과 자원회수시설 현안 지속적 소통
- 시설 이전 신뢰성 제고 대 시민 집중 홍보 : 시·구·동 연계 추진
- 사전조사 용역 완료 및 입지선정위원회 구성 ----- 2025. 3.

□ 사업 홍보실적



▶ 보도자료, SNS 게시

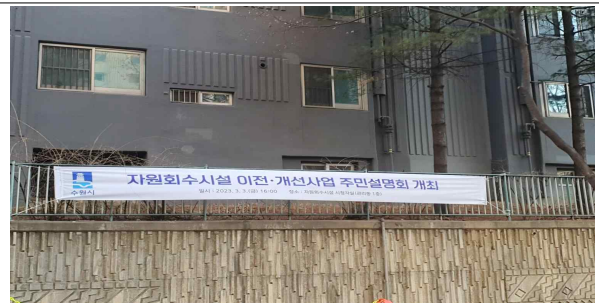

▶ 홍보물 제작·배포 (공청회, 주민설명회)

담당부서	청소자원과	과장	유정수(2250)	자원회수시설이전팀장	홍남석(2682)	주무관	오경희(2902)
------	-------	----	-----------	------------	-----------	-----	-----------
