

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	54%

□ 사업목표

- 통학차량 대기공간 등 편의시설을 제공하여 통학 안전 확보

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년(계속)
- 사업대상: mamsteyshon 50개소
- 주요내용
 - 사업승인 시 mamsteyshon shelchi shelgyebanyng myit gijon gongdongjudeok nae shelchi jiwon
 - 도시재생사업지 및 공동주택 인접 도시공원 내 mamsteyshon shelchi

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2024.12.31. 기준)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	859	9	350	149	250	250	계속
국비	180	0	60	16	60	60	계속
도비	36	0	12	0	12	12	계속
시비	643	9	278	133	178	178	계속
민간자본	0	0	0	0	0	0	0

※ 공동주택과 시비159백만원(신규 공동주택은 비예산임)
도시재생과 국비180백만원, 도비36백만원, 시비84백만원 / 공원관리과 시비 400백만원

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표	
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.		
mamsteyshon shelchi	계	개소	50	2	14	14	10	10	
	신규 공동주택 내	개소	16	2	7	5	1	1	계속
	기존 공동주택 내	개소	20	-	5	5	5	5	계속
	도시재생사업지 내	개소	6	-	계획수립	2	2	2	계속
	공동주택 인접공원 내	개소	8	-	2	2	2	2	계속
사업추진율(누적값)	%		4	32	60	80	100		

□ 추진실적

○ 공동주택 내 맘스테이션 설계반영 등 반영 (추진 중)

구분	세부사항
신규 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> 신규 공동주택 단지 내 20개소 반영 <ul style="list-style-type: none"> 2022년 2개소 : 서둔지구, 권선C8구역 2023년 13개소 (※ 2023년 목표(7개소) 이상 13개소 초과달성) <ul style="list-style-type: none"> (1분기) 권선1구역 재건축 (2분기) 힐스테이트 수원테라스, 영흥공원푸르지오파크비엔, 서광교파크스위첸 (3분기) 이목지구 A3블럭, 이목지구 A4블럭, 센트럴아이파크자이, 권선2구역재건축, 영통1구역 재개발, 화서역 푸르지오 브리시엘, 영통동 961-11 (4분기) 당수지구 C3블럭, 당수지구 D3블럭 2024년 5개소 반영 (※ 2024년 목표(5개소) 달성) <ul style="list-style-type: none"> (1분기) 재개발111-1구역(복수원렉스비아_3개소) (4분기) 영통2구역 주택재건축정비사업(매탄주공4,5단지_2개소)
기존 공동주택	<ul style="list-style-type: none"> 기존 공동주택 단지 내 6개소 반영 <ul style="list-style-type: none"> 2023년 3개소 (※ 2023년 목표(5개소) 미달하여 3개소 달성) <ul style="list-style-type: none"> : 오목천서희스타힐스, 호매실경남아너스빌, e-편한세상광교아파트 2024년 3개소 (※ 2024년 목표(5개소) 미달하여 3개소 달성) <ul style="list-style-type: none"> : 신성신안쌍용진흥(1개소), 두산우성한신(2개소)
공동주택 인접공원 내	<ul style="list-style-type: none"> 2024년 1개소 설치 <ul style="list-style-type: none"> (3분기) 이의초등학교 주변 어울터 1개소 설치

○ 도시재생사업지내 맘스테이션 설치 (추진 중)

□ 「2024 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 : <ul style="list-style-type: none"> 사업 추진율 저조 홍보 전략 부족 문제 등 검토 필요 공공시설 활용방안 등 다양한 실행 방안 모색 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 반영여부 : 일부반영 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 시 홈페이지 및 단지별 홍보 공문 발송 등을 통해 지원사업 독려 재건축 등 다양한 신규 공동주택 설치 요청 다양한 적용 및 실행 방안 검토 중

□ 문제점 및 대책

○ 공동주택 지원사업 신청 저조

- 홍보 및 안내를 통한 지원사업 참여 독려

○ 도시공원 예산 및 대상지 확보 지남

- 공원 리모델링 등 공원 정비 국·도비, 자체예산 등 확보 노력 및 신규 공원 조성 시 반영 검토


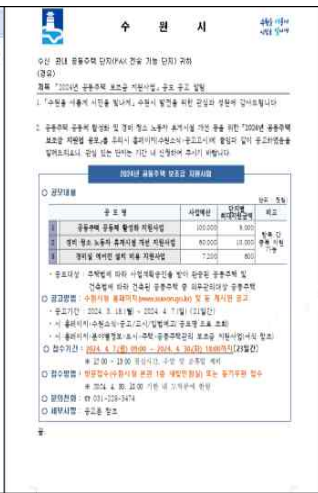

○ 도시재생사업지 내 설치부지 확보 검토

- 당초 거점시설 건립공사 부지 내 설치 예정이었으나, 시공사 파산선고 (2024. 9. 27.)로 인한 공정 지연과 이에 따른 맘스테이션 설치 지연
- 도시재생사업지 내 맘스테이션 설치를 위한 주민 수요조사 지속 실시

□ 향후추진 계획

- 공동주택 내 설치 추진【공동주택과】 ----- 2025. 12월
 - 신규 공동주택 사업계획승인 시 반영(1개소)
 - 기존 공동주택 설치 추진(9개소)
- 도시재생사업지 등 설치 추진(4개소)【도시재생과】 ----- 2025. 12월
- 공원 내 설치 추진(5개소)【공원관리과】 ----- 2025. 12월

□ 사업 홍보실적

		
▶ 시 홈페이지 게시(2024. 3. 18.)	▶ 단지별 공문 발송(2024. 3. 15.)	

담당부서	공동주택과	과장 박종만(2400)	주택행정팀장 조성계(2403)	주무관 이지영(2406)
			임대사업관리팀장 안경하(3050)	주무관 허정혜(3404)
협조부서	도시재생과	과장 김일호(3850)	도시재생사업팀장 박아름(3923)	주무관 정혜숙(3940)
	공원관리과	과장 이종봉(4190)	공원운영팀장 강미선(4181)	주무관 이서영(2237)
